

Curso Superior de Engenharia de Software

Manutenção de Software

PROJETO DE MANUTENÇÃO

Sistema de Gerenciamento Escolar

ENIO, FREDERSON, KAIQUE

Cornélio Procópio 2021

| Controle de Versões | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| Versão | Versão Data Autor Notas da Revisão | | | | |
| 1.0 | 22/10/2021 | Enio, Frederson, Kaique | Adaptação do documento para Plano do Projeto | | |

SUMÁRIO

| Por que? | 4 |
|---|----|
| Objetivos deste documento | 4 |
| Situação atual e justificativa do projeto | 4 |
| Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto | 4 |
| O que? | 4 |
| Requisitos de alto nível | 4 |
| Partes interessadas | 5 |
| Equipe | 5 |
| Externa | 5 |
| Onde? | 5 |
| Como ? | 5 |
| Premissas | 5 |
| Metodologia | 5 |
| Restrições | 5 |
| Riscos de alto nível | 6 |
| Quando? | 6 |
| Resumo do cronograma de marcos | 6 |
| Cronograma Detalhado | 6 |
| Estimativa de esforço baseado em pontos de casos de uso | 7 |
| Detalhamento | 8 |
| Escopo do Produto | 8 |
| Diagramas de Entidade Relacionamento | 9 |
| Diagramas de Caso de Uso | 11 |
| Diagramas de Classe | 13 |
| Gerenciamento de Riscos | 16 |
| Tabela de Riscos do Projeto | 16 |
| Matriz de Probabilidade x Impacto | 16 |
| Exclusões do projeto / Fora do Escopo | 17 |
| Resumo do orçamento | 17 |
| Custos | 17 |
| Aprovações | 18 |
| | |

PLANO DO PROJETO

Por que?

Objetivos deste documento

Documentar o planejamento do projeto de manutenção do software Sistema de Gerenciamento Escolar no tratamento de correções e melhorias, definindo seu escopo, cronograma, riscos e valores

Situação atual e justificativa do projeto

Foi analisado e testado o software a encontrado 3 correções necessárias e 5 sugestões de melhorias para atender ao propósito do software

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Elaborar as correções e melhorias necessárias para que o software atenda ao MVP (Mínimo Valor do Produto) assegurando uma melhor aceitação por parte do seus usuários, fazendo essa entrega até a data de 10/12/2021

O que?

Requisitos de alto nível

- Cadastro de Alunos, Professores e Terceiros totalmente funcional
- Salas incluindo Alunos, professores e terceiros
- Relatórios que exibem de forma clara as relações que o software atende

Partes interessadas

Equipe

- Frederson Mandu de Oliveira.
- Kaique Campos.
- Enio Amarantes.

Externa

- Alunos
- UTFPR câmpus Cornélio Procópio.
- Professores.
- Outros Campus de outras Universidades

Onde?

• UTFPR câmpus Cornélio Procópio.

Como?

Premissas

- Total de 3 integrantes.
- Habilidades de programação e documentação aprofundada.
- Integrantes com habilidades específicas.

Metodologia

Iterativo incremental.

Restrições

Pouco tempo hábil em projeto.

Riscos de alto nível

- Não concluir.
- Comunicação da equipe.
- Aceitação do Orçamento
- Divulgação do App.

Quando?

Resumo do cronograma de marcos

- Elaboração do projeto 28/09/2021 23/10/2021.
- Execução do Projeto 01/11/2021 19/11/2021.
- Finalização 22/11/2021 10/12/2021.

Cronograma Detalhado

| Código | Descrição | Tipo | Prioridade | Início | Término |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| C1 | Validar campos que exijam apenas números | Corretiva | Baixa | 15/11/2021 | 19/11/2021 |
| C2 | Validar campos vazios ao clicar em Criar | Preventiva | Média | 08/11/2021 | 12/11/2021 |
| C3 | Corrigir botão de atualização | Corretiva | Alta | 01/11/2021 | 05/11/2021 |
| M1 | Definir um tamanho máximo para as colunas das tabelas | Perfectiva | Baixa | 15/11/2021 | 19/11/2021 |
| M2 | Aumentar o tamanho do botão de voltar, para melhor visualização | Adaptativa | Mèdia | 08/11/2021 | 12/11/2021 |
| M3 | Inserção de caixas para exclusão | Adaptativa | Alta | 01/11/2021 | 05/11/2021 |
| M4 | Bloquear inserção de valores iguais | Adaptativa | Alta | 01/11/2021 | 05/11/2021 |
| M5 | Armazenar arquivos em um banco de dados | Perfectiva | Baixa | 15/11/2021 | 19/11/2021 |

Estimativa de esforço baseado em pontos de casos de uso

| ALI | TED | TER | L | С | Complexid ade |
|----------------|-----|-----|----|---|---------------|
| C1 | 1 | 1 | 9 | В | Baixo |
| C2 | 3 | 1 | 9 | В | Baixo |
| C1 C2 C3 | 3 | 1 | 9 | В | Baixo |
| | | | | | |
| M1 | 4 | 1 | 9 | В | Baixo |
| M2 | 4 | 1 | 9 | В | Baixo |
| M3 | 1 | 1 | 9 | В | Baixo |
| M4 | 1 | 1 | 9 | В | Baixo |
| M5 | 12 | 3 | 11 | В | Médio |
| | | | | | |

Total de Pontos por Função

Preço por ponto de Função R\$ 1.672,52

59

Total do Valor do Projeto R\$ 98.678,68

Detalhamento


Escopo do Produto

Foram levantadas as correções e melhorias necessárias para o produto.

| Código | Descrição | Tipo |
|--------|---|------------|
| C1 | Validar campos que exijam apenas números | Corretiva |
| C2 | Validar campos vazios ao clicar em Criar | Preventiva |
| C3 | Corrigir botão de atualização | Corretiva |
| C4 | Lançamento de exception, index fora do array ao clicar 2 vezes no atualizar | Corretiva |
| | | |
| M1 | Definir um tamanho máximo para as colunas das tabelas | Perfectiva |
| M2 | Aumentar o tamanho do botão de voltar, para melhor visualização | Adaptativa |
| M3 | Inserção de caixas para exclusão | Adaptativa |
| M4 | Bloquear inserção de valores iguais | Adaptativa |
| M5 | Armazenar arquivos em um banco de dados | Perfectiva |
| M6 | Criar Sala para Relacionar entidades | Perfectiva |

1. Diagramas de Entidade Relacionamento


1.1. DER Atual








1.2. DER Proposto

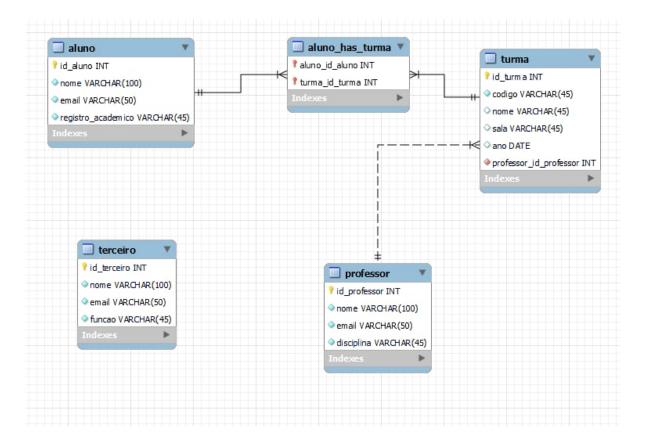


2. Diagramas de Caso de Uso

2.1. Caso de Uso Atual

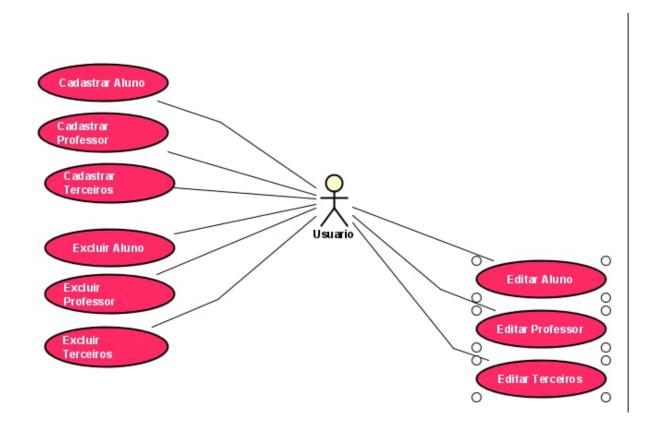



2.2. Caso de Uso Proposto

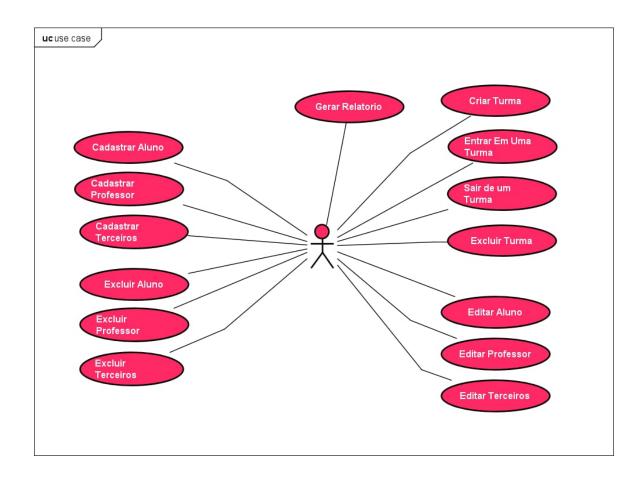


3. Diagramas de Classe


3.1. Diagrama de Classes Atual

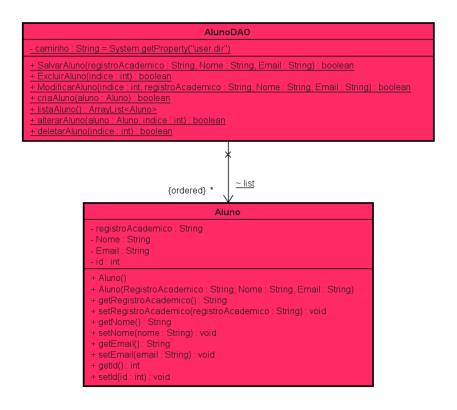


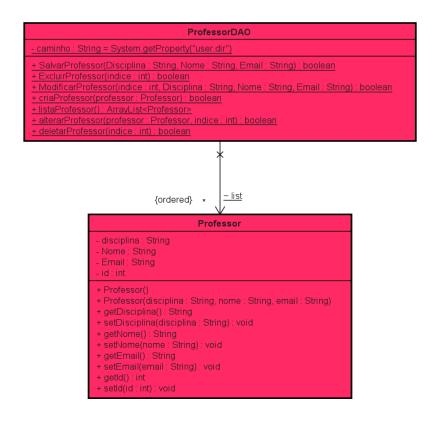

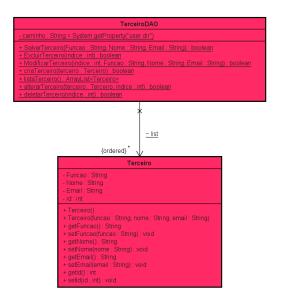

3.2. Diagrama de Classes Proposto

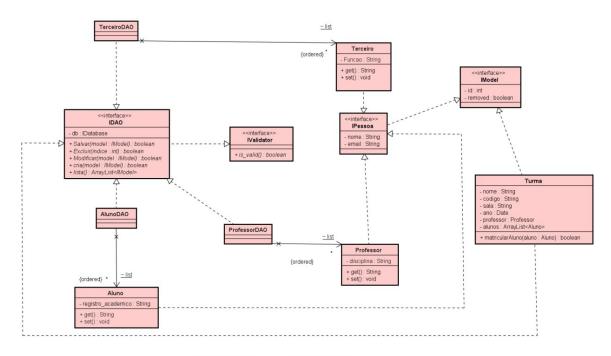



Gerenciamento de Riscos

Tabela de Riscos do Projeto

| | | Custo Projeto: | R\$ 98.678,47 | G | eren | ciamento d | los riscos do projeto | |
|-----------------------|--|---|---------------|---------|-------|--|---|-----|
| m p a c t | 1 0,05 2 0,1 3 0,2 4 0,4 5 0,8 | | | Risco | | Aceitar Mitigar Evitar ou Transferir | | |
| ID | Tipo | Descrição Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Custo do Risco | Plano de ação | % |
| 1 | Orçamento | Não aceitação do valor do projeto | 90% | 3 | 0,18 | R\$ 17.762,12 | Adaptar o projeto para ser feito sem a integração com a biblioteca | 60% |
| 2 | Projeto | Atrazar a entrega | 30% | 2 | 0,03 | R\$ 2.960,35 | Comunicar o cliente antecipadamente sobre o atrazo | 20% |
| 3 | Pessoal | Pouca experiência da aquipe com o deploy | 70% | 3 | 0,14 | R\$ 13.814,99 | Contatar o supor te da provedora do serviço | 40% |
| 4 | Pessoal | Falta de treinamento da equipe | 10% | 3 | 0,02 | R\$ 1.973,57 | Realizar / Comprar treinamentos sobre os assuntos de interesse | 10% |
| 5 | Manutenção | Entrega final com muitas falhas | 70% | 3 | 0,14 | R\$ 13.814,99 | Restringir o uso do sistema até a correção dos erros mais críticos | 40% |
| 6 | Tamanho do produto | Modificação dos requisitos | 90% | 2 | 0,09 | R\$ 8.881,06 | Restringir alterações significativas nos requisitos | 60% |
| 7 | Pessoal | Ausência de um ou mais membros da equipe por motivo de saúde | 40% | 3 | 0,08 | R\$ 7.894,28 | Contratar um profissional substituto ou terceirizar | 30% |
| 8 | Pessoal | Quantidade de colaboradores insuficientes para desenvolver o projeto dentro de um tempo hábil | 10% | 3 | 0,02 | R\$ 1.973,57 | Contratar mais profissionais capacitados para o projeto | 10% |
| 9 | Risco de mercado | Produto final não ter aceitação esperada | 10% | 5 | 0,08 | R\$ 7.894,28 | Efetuar alterações para que se adeque as necessidades do cliente e a melhora da aceitação do produto | 10% |
| 10 | Orçamento | Redução do orçamento | 10% | 4 | 0,04 | R\$ 3.947,14 | Comunicar o cliente a respeito das novas restrições no orçamento e tentar adequar o projeto a nova realidade, mudando ou retirando funcionalidades a fim de reduzir custo | 10% |

Matriz de Probabilidade x Impacto

| Probabilidade | Risco = P x I | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|---------|-------|------|--|--|
| 0,9 | | ID 6 ID1 | | | | | |
| 0,7 | | | ID 3, 5 | | | | |
| 0,5 | | | ID 7 | | | | |
| 0,3 | ID 8 | ID 2 | | | | | |
| 0,1 | | | ID 4 | ID 10 | ID 9 | | |
| | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | | |
| | Impacto no objetivo | | | | | | |

Exclusões do projeto / Fora do Escopo

Este projeto se limita às correções e melhorias propostas dentro do projeto e o prazo de manutenção vigente dentro do cronograma futuras melhorias e evoluções do produto será necessário um novo projeto.

Resumo do orçamento

Custos

| Custos | Valor |
|--------------|---------------|
| Equipe | R\$ 67.275,48 |
| Licenças | R\$ 0,00 |
| Viagens | R\$ 0,00 |
| Treinamentos | R\$ 9.057,03 |
| Testes | R\$ 22.345,96 |
| Total | R\$ 98.678,47 |

| Aprovações | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|--|
| Participante | Assinatura | Data | | | |
| Patrocinador do Projeto: Adriana Herden | | | | | |
| Gerente do Projeto: Enio Amarantes | | 22/10/2021 | | | |
